

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Электросталь

Наименование проекта Ремонт актового зала для муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №17»,  
городской округ Электросталь, ул. Мира, д.20в

### 1.Сведения о поступлении денежных средств в резерве источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения
всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3			
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11 +12	10	11	12	13=5-9		
300 000,00	239 700,00	57 300,00	3 000,00	299 517,44	239 314,43	57 203,01	3 000,00	131 289,84	104 900,58	23 389,26	3 000,00	168 024,59	168 024,59	Снижение НМЦК при проведении закупки путем аукциона в электронной форме

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;


ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций,  
за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

## 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включённый в проект, завершён своевременно  
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: \_\_\_\_\_
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 19.10.2020 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 06.11.2020 г.
5. К отчету прилагается на 3 листах: фотографии (до начала работ, промежуточные этапы выполнения, после выполнения работ)


Инициатор (представитель инициативной группы):

\_\_\_\_\_  
Васильев Н.И.  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
  
(подпись)

ВРИП Главы городского округа  
Электросталь Московской области

\_\_\_\_\_  
Волкова И.Ю.  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
  
(подпись)




Дата « \* » 20\_\_ г.

## До начала работ





## Промежуточные этапы выполнения

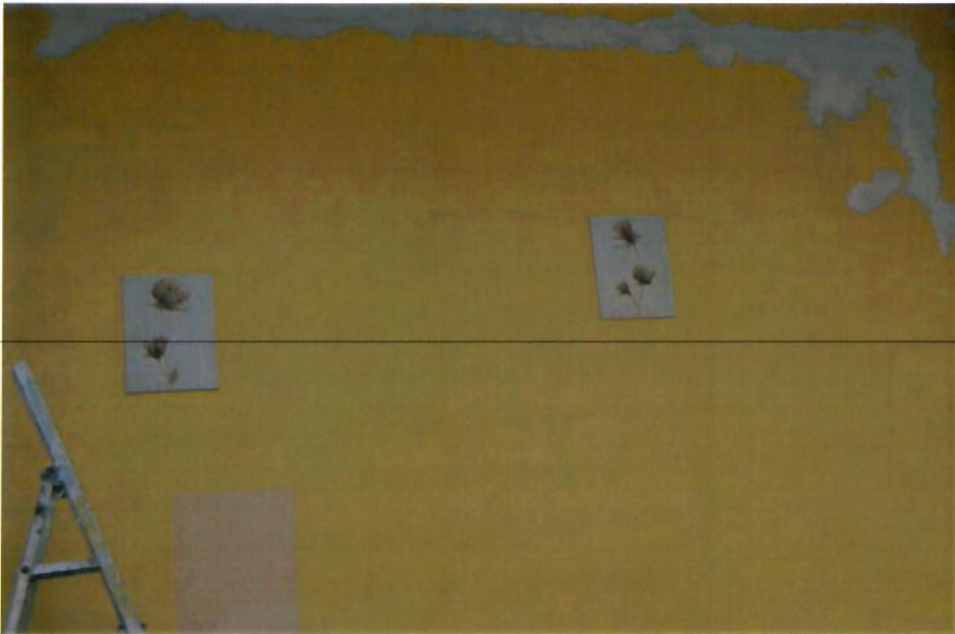

## После выполнения работ

